
摘要：

澳大利亚数据中心运营商Nextdc因墨尔本居民阻挠输电线路施工，M3项目供电推迟至2028财年，FY2027业绩指引下调逾三分之一，股价暴跌最高45%，并暂停所有新开发与土地收购。此事凸显全球数据中心交付困境，上半年美国已有106个项目受阻。高盛早前示警资金才是“手刹”，不可抗力正成为行业新词汇。

澳大利亚数据中心行业正遭遇一场由社区抗议引发的信任危机。AI基建投资热潮之下，土地、资金和电力许可构成的"三重瓶颈"正在将纸面上的高增长叙事打回现实。

“澳洲版CoreWeave”、AI基建的风向标NextDC周三披露，**由于墨尔本内城区居民持续阻挠高压输电线路施工，公司旗下重要项目M3的供电计划已推迟至2028财年，导致FY2027业绩指引被大幅下调逾三分之一。**公司同时宣布暂停所有新开发项目和土地收购，并正就相关合同评估是否可援引不可抗力条款。

消息公布后，Nextdc股价在悉尼市场结束两天交易暂停后随即大跌最高45%至5.07澳元，股价回落至2019年水平，并拖累本地同业集体下挫。

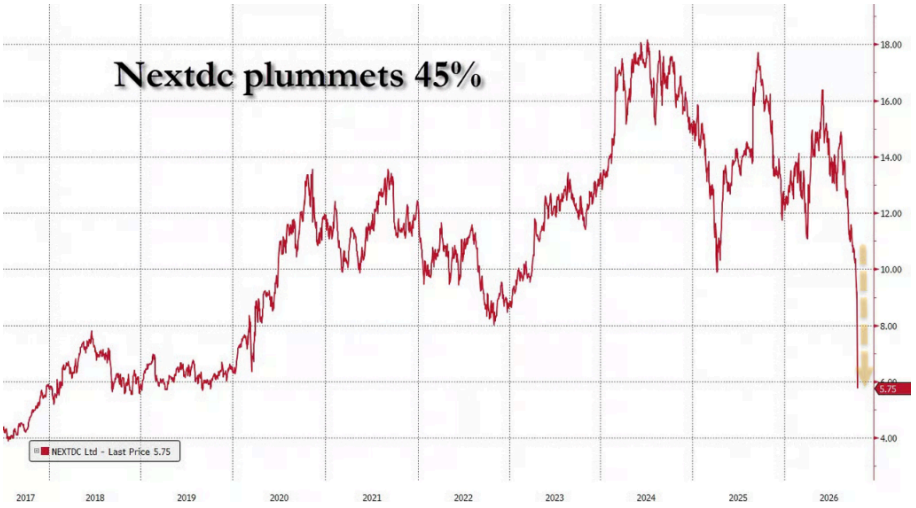


这一事件进一步印证了全球数据中心行业普遍面临的交付困境——GPU就位、客户合同在手，真正卡住项目的往往是电网接入许可与周边居民的反对。据彭博报道，仅在今年上半年，美国就已有至少106个数据中心项目因社区反对而受阻或延迟，涉及投资规模约1980亿美元。


## 铲车被居民堵回去：M3项目的"低技术"崩塌

Nextdc股价崩跌的导火索，是一幕颇为戏剧性的社区对抗场面。

为向M3项目供电，电网运营商Jemena Electricity Networks需要在墨尔本西部内城区Maribyrnong的居民街道上架设高压输电线杆。今年9月，当地居民用私家车封堵施工车辆，并将已开挖的沟槽重新填平。Jemena随即以"安全顾虑及工地访问受阻"为由暂停施工，并表示最早2027年2月前无望复工。M3的下一次电网增容供应，已因此滑入FY2028。

当地议会还在等待进一步社区咨询后才会给出规划批准，M3第六、七期的规划决定已被推至2027年——届时恰好越过维多利亚州政府于11月28日大选前进入看守期的节点。

对Nextdc的财务影响迅速显现。根据公司向澳交所提交的文件：FY2027净营收指引从6.15亿至6.40亿澳元下调至4.75亿至5.00亿澳元；FY2027基础EBITDA指引从3.85亿至4.10亿澳元削减至2.45亿至2.65亿澳元，中位数降幅约36%；FY2027资本支出指引从52.5亿至57.5亿澳元收窄至45亿至50亿澳元。

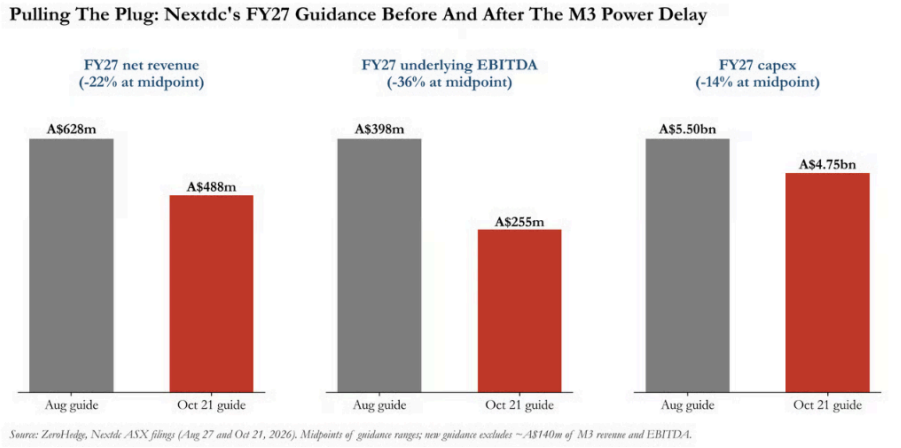


新指引剔除了与M3受影响合同相关的约1.4亿澳元收入和EBITDA，其中涉及部分已开始计费的容量。公司同时警告，若需向客户支付服务等级违约赔偿，EBITDA可能进一步承压。公司CEO Craig Scroggie在投资者电话会议上表示：

> "我们不会在任何没有现有客户承诺的站点上继续任何工作。"

## 高盛早示警，资金仍是"手刹"

就在此次崩跌的八天前，高盛分析师Chris Boulus团队发布了一份覆盖澳新数字基础设施的大型报告，**预测澳新地区IT负荷需求到2030年将扩张至5.2GW，届时存在0.7GW的供需缺口，并将整体数据中心资本支出周期规模定性为500亿至650亿澳元。**

值得注意的是，高盛在同一份报告中已对Nextdc给出了谨慎评级。彼时，高盛以"买入"评级启动对Goodman Group和Megaport的覆盖，却仅以"中性"评级、目标价11澳元起始对Nextdc进行跟踪，理由是"市场热爱宏观需求叙事，但资金才是真正的手刹"。该报告将Nextdc的FY2028/2029年EBITDA预测定于市场共识低3至5%，并提示公司面临逾10亿澳元的潜在融资缺口，并追问"去风险化资本合资"还是"潜在摊薄性股权融资"将是其走向。

目前，Nextdc账面上仍拥有87亿澳元流动性，其中包括67亿澳元未提取的优先债务，公司表示仍符合契约条款。但公司同时在文件中警告，若账单配置出现实质性变化——例如M3延迟导致的收入缺口——可能限制其提取上述优先债务的能力。据Market Index援引瑞银预测，Nextdc预计最早要到FY2031年才能实现盈利，长期债务峰值将于FY2030年膨胀至112亿澳元。以当前股价计算，Nextdc的FY2027年EV/EBITDA估值约为37倍，而据高盛数据，全球同类纯数据中心运营商的平均估值为22倍，且这一比较尚未纳入最新的11亿澳元可转换票据。Market Index因此指出，Nextdc"即便再跌40%，也只是回归全球同业估值水平"。

## "不可抗力"正在成为数据中心行业新词汇

Nextdc援引不可抗力条款并非个案。

今年9月24日，甲骨文就其新墨西哥州大型"Project Jupiter"园区发出不可抗力通知，原因同样是许可延迟与电力接入受阻，此后外界获悉该公司不得不向数据中心运输天然气以维持运营。10

月初，芬兰当局下令谷歌暂停两座数据中心的建设工程。如今，相同的情形在墨尔本再次上演。

据彭博报道，摩根士丹利此前估计，**仅2025年全球已有1560亿美元数据中心项目被取消或延迟，2026年一季度这一数字进一步达到1300亿美元。德克萨斯州已直接下令暂停新数据中心建设。**


RBC对此明确表态，称M3延迟事件是"社区反对对数据中心已签约容量交付时间构成真实风险"的有力佐证。花旗银行日本、北亚及澳大利亚投行业务主管Mark Luet在接受彭博电视采访时表示，投资者未来将"更具甄别能力"，同时补充道："我们丝毫不怀疑AI基础设施这一主题将持续推进。"

## 自备电源，还是无从入场

在业界看来，破解电网接入困境的根本出路在于"自备电源"。澳大利亚政府已于今年7月出台强制性国家规定，要求数据中心运营商"全额自筹电力需求并为新发电项目提供保障"。

高盛在其Carbonomics报告中也调整了预测，分析师Michele Della Vigna将全球数据中心"后端电表"（behind-the-meter）电力供应预测上调至2030年的67GW，届时现场燃气轮机、往复式发动机和燃料电池将满足全球数据中心25%的电力需求，而这一比例在2025年"几乎为零"。背后的逻辑在于：电网接入等待时间已从历史上的约两年延伸至如今的七年以上，而数据中心本身的建设周期仅需两至三年。

**Exhibit 7: As conventional power backlogs grow, speed-to-power becomes increasingly important for data centers**
Time to power by power solution

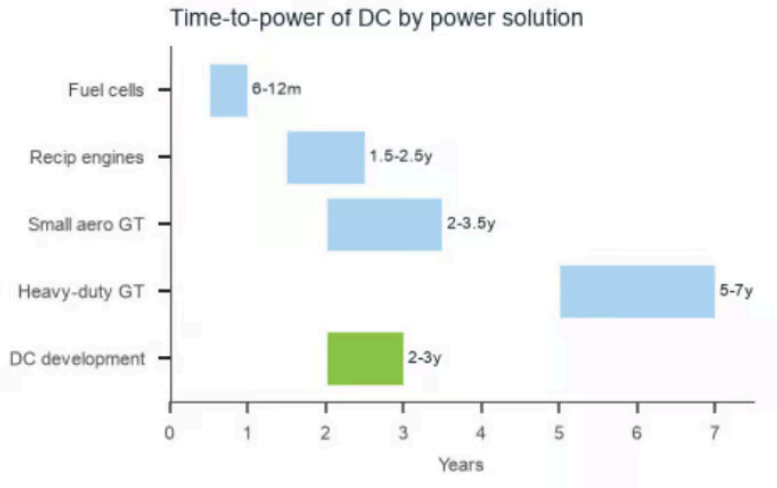


Source: Data compiled by Goldman Sachs Global Investment Research

M3项目正是这一矛盾的缩影：建筑主体大致完工，客户合同已在手，唯独缺少的是一条66千伏的电网增容线路——而这条线路被几辆私家车和几把铲子挡在了街道外。

与此同时，澳大利亚储备银行副行长Andrew Hauser最近将"数据中心建设热潮"列为澳大利亚通胀的三大上行风险之一，促使高盛澳大利亚经济学家修正此前的暂停加息预期，转而预测澳储行将于11月加息25个基点至4.85%。这意味着：数据中心投资热潮正在抬高数据中心行业自身的融资成本——对于一个高盛早已指出"资金是最大制约"的行业而言，这一反馈循环远称不上理想。

Nextdc董事会将于11月20日年度股东大会上公布资本支出审查结果，届时"出售近期不需要的开发地块"是否会成为系列资产出售的起点，值得市场密切关注。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。






限免

110 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片 发布评论
