

摘要：

甲骨文向Project Jupiter开发商发出“不可抗力”通知，担忧这一位于新墨西哥州、计划为OpenAI提供3000亿美元算力的数据中心项目无法按原计划于2028年投运。该项目此前已面临监管和融资压力，相关贷款跌至承压水平，此次通知进一步加剧市场对项目落地及融资链稳定性的担忧。

甲骨文援引不可抗力条款，试图为其在新墨西哥州的巨型数据中心项目筑起财务防火墙，这一举动令本已深陷困境的Project Jupiter再添变数，并迅速向整条融资链传导压力。

据彭博报道，甲骨文已向该项目开发商——Blue Owl Capital旗下子公司Stack Infrastructure——发出援引不可抗力条款的正式通知。

报道称，甲骨文此举并非意图退出主要租户地位，而是寻求在项目无法按原计划于2028年上线的情况下，推迟相关付款义务。


消息公布后，甲骨文股价随即下挫，日内一度跌超7%，最终收盘仍跌约3.5%，Blue Owl Capital股价同步收跌3.6%，数据中心供能商Bloom Energy跌幅亦达3.1%。



Symbol	Price	Change	% Change	Prev Close
OWL Blue Owl Capital Inc	\$9.25	-0.35	-3.60%	\$9.60
ORCL Oracle Corp	\$139.53	-5.03	-3.48%	\$144.56
BE Bloom Energy Corp	\$266.52	-8.67	-3.15%	\$275.19

Project Jupiter是一个规模庞大的特殊目的载体（SPV）项目，计划在新墨西哥州约1400英亩土地上建设四座数据中心，为OpenAI提供总计3000亿美元的算力，融资结构涵盖债券、贷款及Blue Owl股权。此次不可抗力通知的发出，令市场对该项目能否如期推进的疑虑骤然升温，相关贷款此前已跌至承压水平。

Simplified Project Jupiter Structure: Entities and Fund Flows

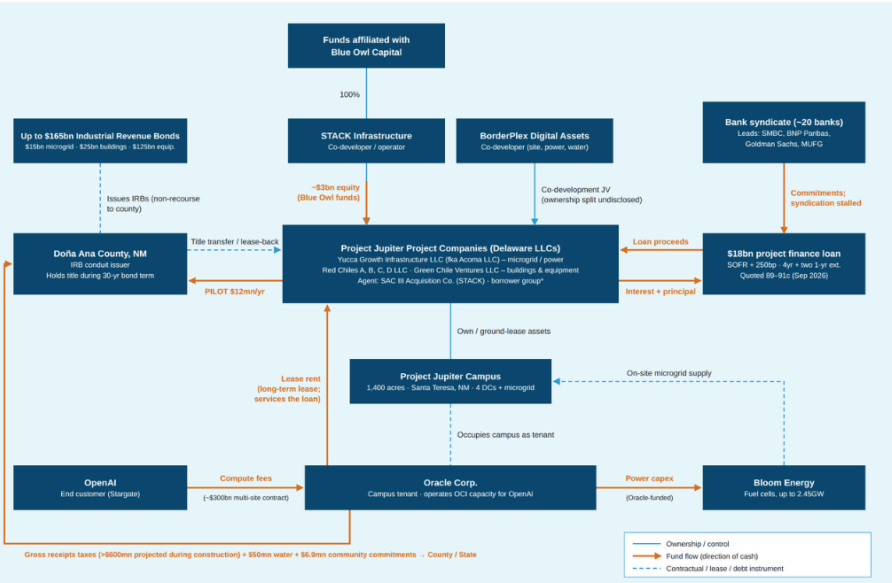

*Legal borrower not publicly disclosed; press describes an Oracle-led project financing secured on the campus, with Santander and Jefferies among holders. Equity split between Blue Owl/STACK and BorderPlex is undisclosed. IRBs are a conduit tax-oblivious structure (county holds title, leases back) rather than third-party holding. OpenAI contract value is as reported for all S&P sites.

Source: Zenerledge, Bloomberg, FTReuters, The Information, Doña Ana County ordinances 367366-2025, Oracle, DCD, Searchlight NM, Haussamen. Compiled September 2026.

项目本身：规模宏大，麻烦同样巨大

Project Jupiter位于新墨西哥州多纳纳纳县，占地约1400英亩，设计算力容量达2.45吉瓦，相当于约180万户家庭的同时用电量，总投资规模约为1650亿美元。

该项目由Stack Infrastructure开发，是Blue Owl的投资组合公司，而Blue Owl本身亦承诺提供股权资金。

然而，项目自宣布至今近两年，已陷入多重困境：

- 关键能源许可申请遭到拒绝；
- 当地居民对项目的供水影响和空气质量问题强烈抗议；
- 甲骨文签约的能源供应商Bloom Energy的燃气排放同样引发外界批评。

据彭博此前报道，项目首期工程已较原定完工时间延误至少七个月，原计划于今年11月投入运营的节点已不可能实现。

雪上加霜的是，为Project Jupiter供气的Energy Transfer LP天然气管道项目，原定本月投入使用，但因新墨西哥州土地局多次拒绝批准管线路线许可，已延期至少六个月，最早于2027年2月1日才能投入服务。

Bloom Energy股价随甲骨文消息应声下跌。

不可抗力通知：法律手段背后的财务逻辑

不可抗力条款在能源与大宗商品领域长期是应对极端事件的标准工具。

但据律所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP今年6月发布的客户简报，此类条款正在数据中心开发领域加速普及。简报指出：



在AI数据中心项目中，不可抗力条款已不再是合同末尾的样板条文，而是一项核心的诉讼与风险分配工具，可以决定一个延误究竟只是孤立事件，还是会级联穿透整个项目的建设、客户、电力、保险与融资文件。

彭博指出，甲骨文发出该通知的意图，并非立即退出作为项目主要租户的角色，而是在Project Jupiter无法按2028年计划上线的情况下，为自身争取暂缓付款的合同依据。

不过，此举是否能真正豁免甲骨文此前承诺的财务义务，目前仍存在不确定性。对此，甲骨文发言人回应称：

Project Jupiter仍在按计划推进，我们对新墨西哥州的承诺坚定不移，对项目前景充满信心。


此外，值得关注的是，数据中心租约通常含有条款，允许客户在服务未能按时启动的情况下退出合同。谷歌今年与SpaceX签订算力合同时，即保留了在特定日期前无法获得访问权限情形下的终止权利。

连锁反应：星际之门蓝图与OpenAI的双重压力


Project Jupiter延误的影响远不止于单一项目。作为星际之门计划的旗舰园区，其进度直接牵动OpenAI的算力部署节奏。

OpenAI此前已与甲骨文和软银签署协议，支持包括新墨西哥州在内的五个数据中心的开发建设，算力缺口一旦形成，将对其产品扩张计划和商业化进程产生实质影响。

Blue Owl Capital股价随消息公布跌至近两个月低点，持续逼近历史低位。甲骨文自身财务状况亦不容乐观，公司债务规模约为1670亿美元。

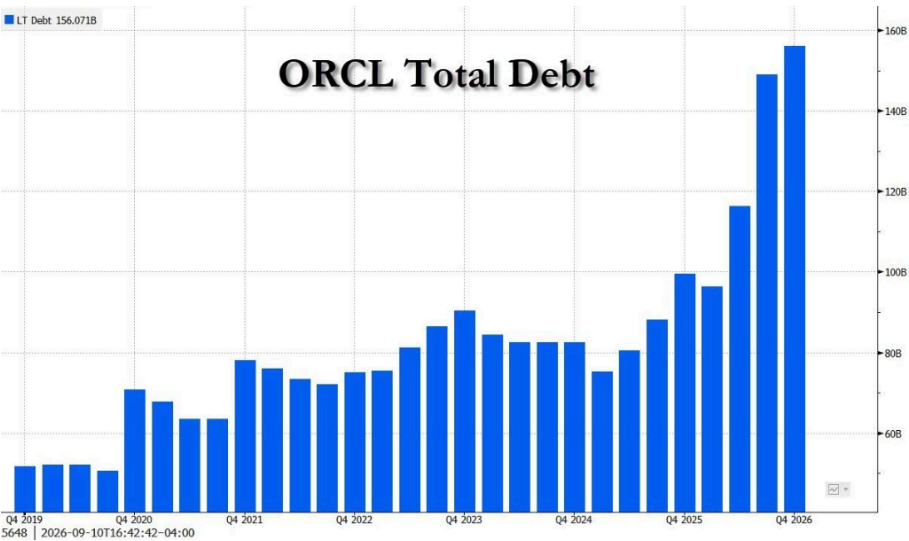

甲骨文的信用违约互换（CDS）价差已连续刷新历史高位。

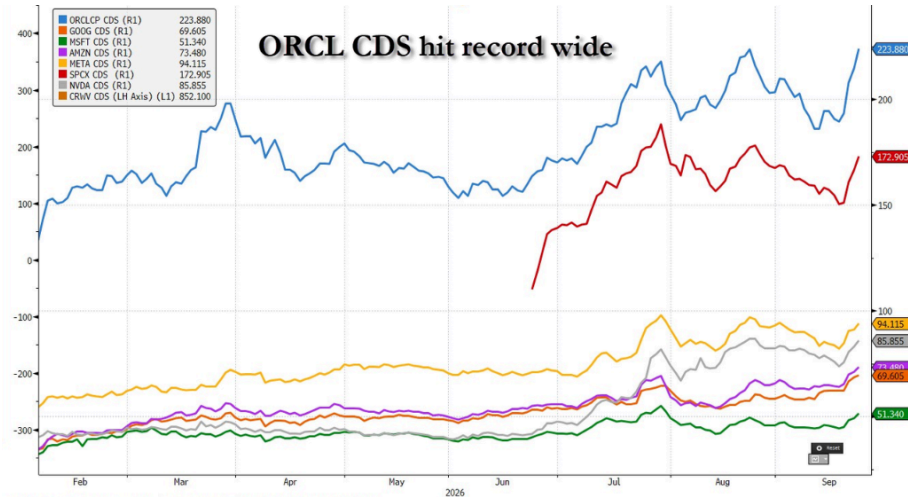

星际之门计划的另一锚点项目、由软银孙正义主导的SB Energy数据中心同样麻烦缠身。该项目IPO计划已因类似的延误问题被迫推迟。

SB Energy设计发电量高达8吉瓦，完工后将成为全球最大数据中心，但其落地同样面临来自地方层面的强烈阻力。甲骨文今日的不可抗力通知，或将进一步打击外界对该IPO的信心。

政治变量：中期选举或加剧项目不确定性

项目所在的新墨西哥州正成为AI数据中心建设争议的政治风向标。

当地居民此前并不知晓该项目与甲骨文和OpenAI存在关联。据彭博此前查阅的文件显示，开发商在获得审批后才公开了这一信息，由此引发更广泛的信任危机。

甲骨文目前已在新的墨西哥州展开公关攻势，试图化解当地反对情绪，但效果尚不明朗。

美国中期选举结果将成为影响项目走向的关键变量，若民主党赢得多数席位，外界普遍预期将对相关项目施加更严格的监管审查，进一步推迟建设进程。

这一政治不确定性，叠加许可瓶颈、融资压力与能源供应延误，正在将Project Jupiter从一个AI投资盛景的象征，逐步演变为整个美国AI基础设施建设能否如期落地的压力测试。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

953 收藏

分享到: 微信 微博

写评论


请发表您的评论



表情 图片

发布评论

6 条评论



正在加载 .

